


Diagrama do fluxo completo (IPPC-TIC)

Diagrama do fluxo completo (IPPC-TIC)


Este diagrama mostra o fluxo de planejamento de contratação de TIC conforme o IPPC-TIC AGU/MGI. Cada caixa é um artefato que precisa ser produzido. As setas indicam a ordem obrigatória.

Fluxo de Planejamento da Contratação (Fase 1)

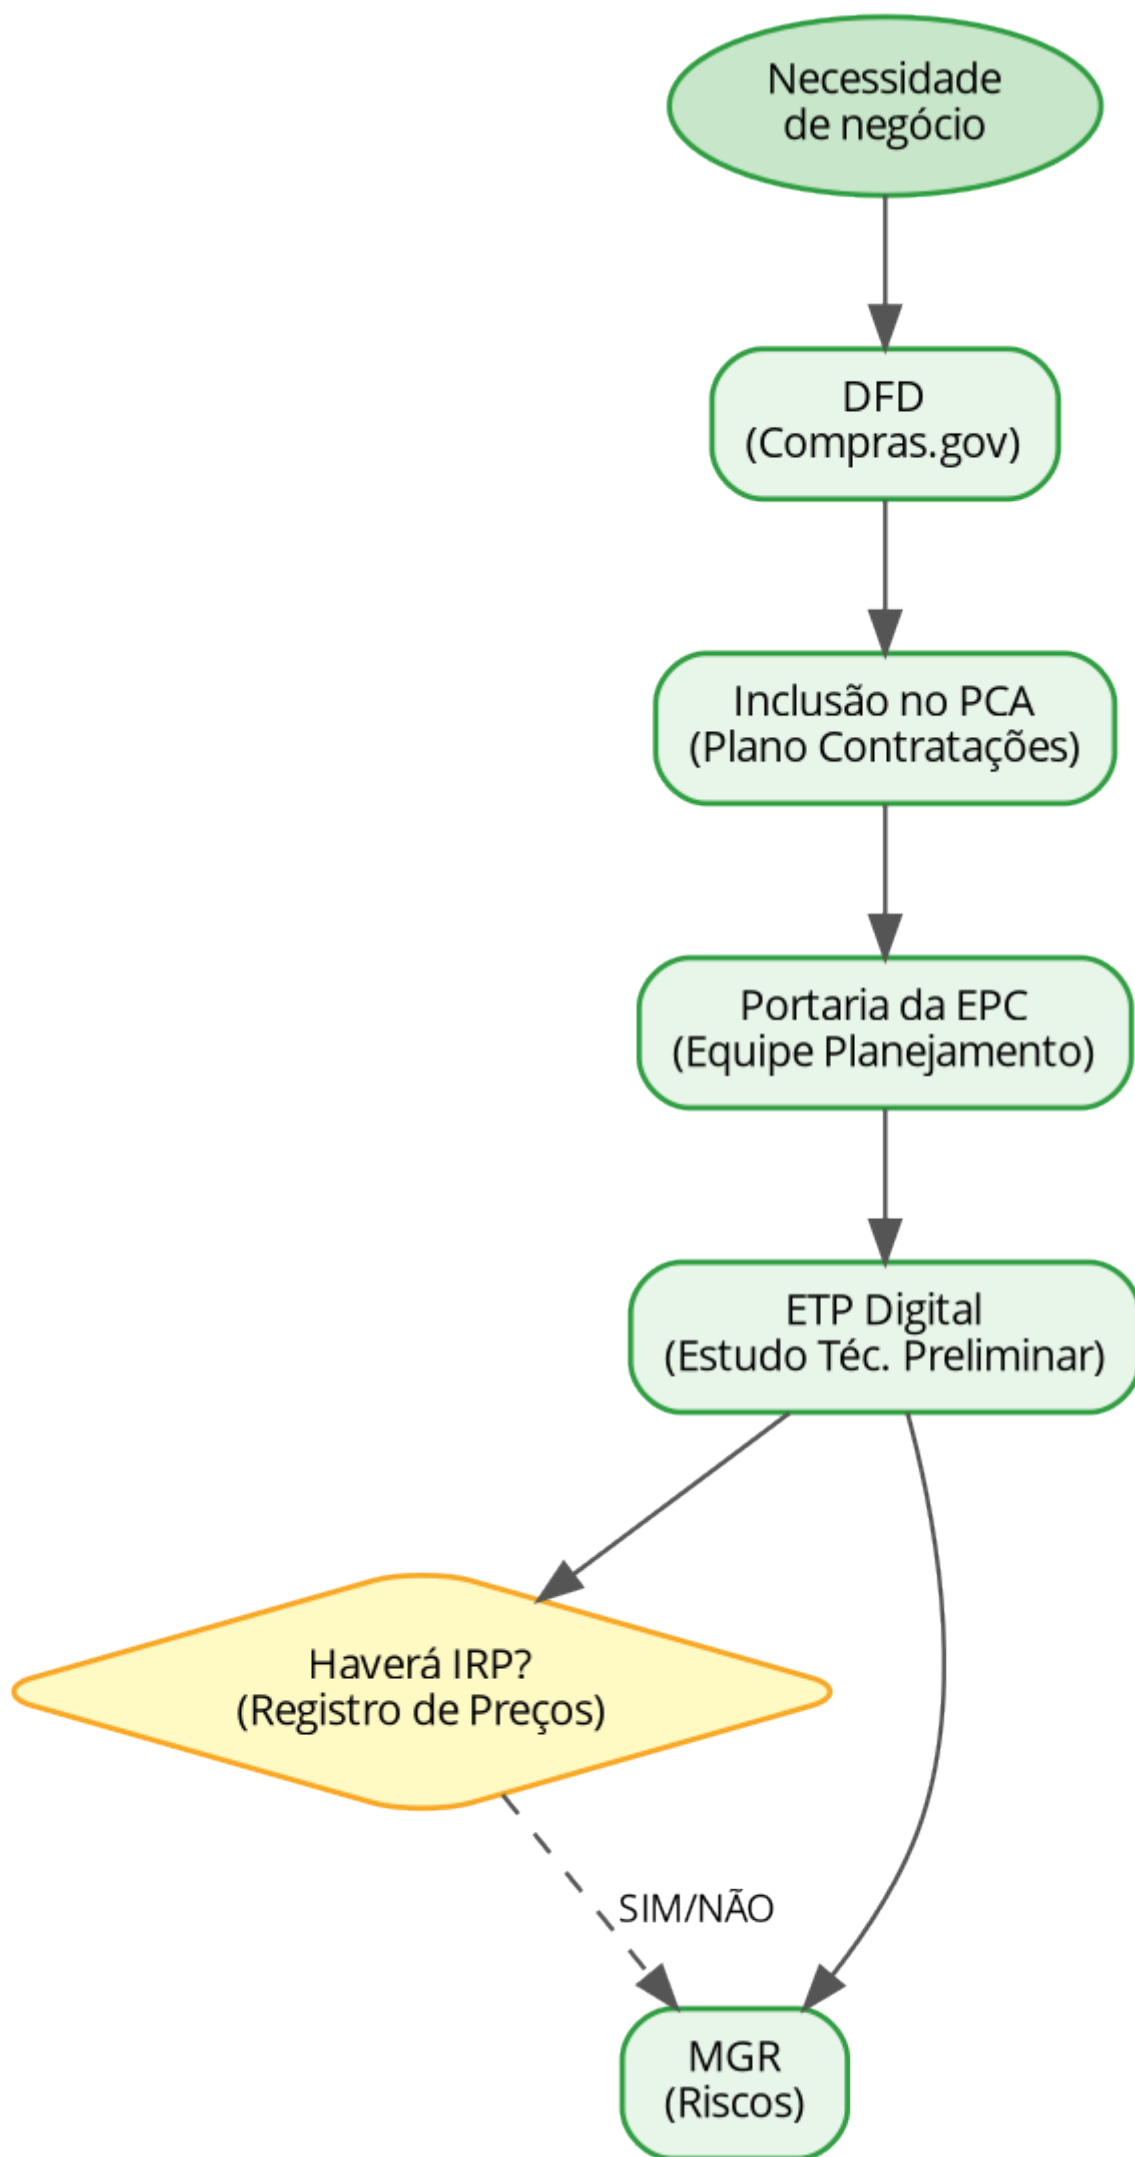


Decisão de modalidade (entre Fase 1 e Fase 2)


Com o TR aprovado, define-se como será a seleção do fornecedor:

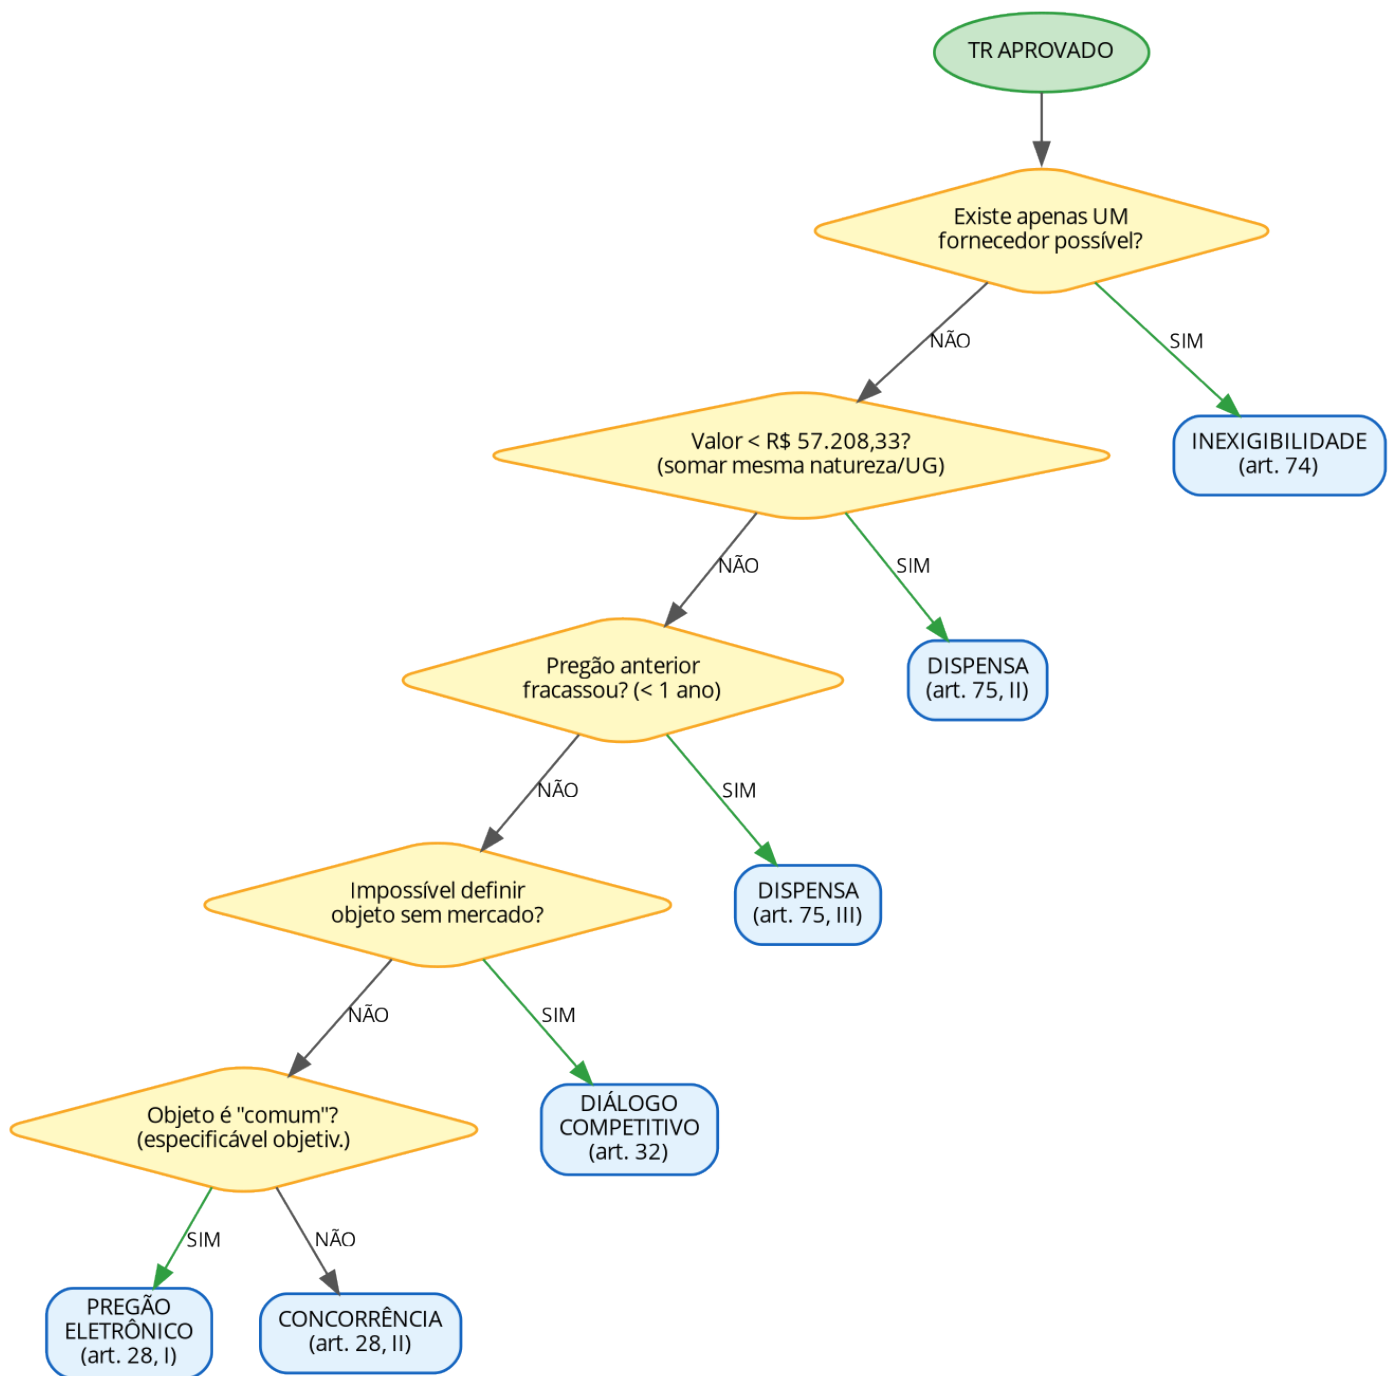

Fase 2 — Seleção (simplificado)



Fase 3 — Gestão (simplificado)

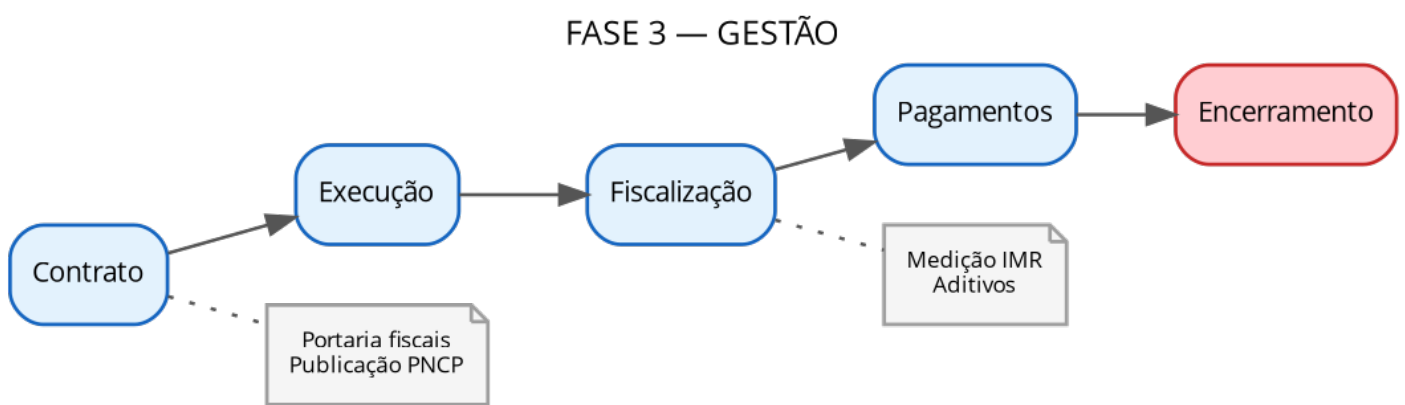

Tempo total estimado (do início ao contrato assinado)

Modalidade	Planejamento	Seleção	Total típico
Dispensa (baixo valor)	30-45 dias	10-15 dias	45-60 dias
Pregão Eletrônico	60-90 dias	30-60 dias	90-150 dias
Inexigibilidade	30-60 dias	15-30 dias	45-90 dias
Concorrência	60-90 dias	60-90 dias	120-180 dias
Diálogo Competitivo	60-90 dias	90-180 dias	6-12 meses

Esses prazos **não incluem** o tempo de análise jurídica (ELIC/PF), que pode adicionar 20-45 dias ao processo.

Próximo passo

O Capítulo 2 detalha cada artefato da Fase 1 — explicando o que é, como fazer e qual sistema usar.

Revision #1

Created 2026-08-01 19:19:17 -03 by Jailton Soares de Araujo

Updated 2026-08-01 19:19:25 -03 by Jailton Soares de Araujo
